RUTA CRÍTICA: EJERCICIOS RESUELTOS CON EL MÉTODO PERT CPM

PERT es una técnica de planificación y control del tiempo. A diferencia de CPM, que es un método para controlar los costos y el tiempo. Si bien PERT ha evolucionado como un proyecto de investigación y desarrollo, CPM evolucionó como un proyecto de construcción. PERT se establece según los eventos, mientras que CPM está alineado con las actividades.


Cómo ya es costumbre, cada tema que tratamos en **Plan de Mejora** cuenta con su sección de ejemplos resueltos; es por ello que, para complementar nuestras entradas relacionadas con la gestión de proyectos, te presentamos **"Ruta Crítica: ejercicios resueltos con el método PERT CPM"**, que incluye un ejercicio resuelto de 25 actividades.

Antes de empezar te invitamos a revisar las siguientes entradas para interiorizar algunos conceptos:

Como material complementario, te recomendamos dar una mirada a nuestras entradas:

Te sorprenderás con lo fácil que es resolver ejercicios de proyectos con estas opciones.

Importante: Debes tener presente que se utilizará la siguiente estructura para representar cada actividad:

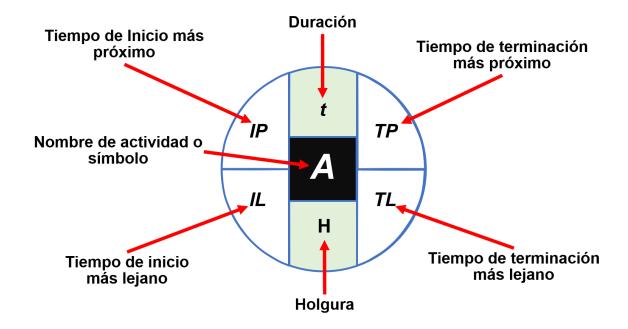

Ejercicio 1:

Una firma de contadores públicos requiere las siguientes actividades para una auditoría:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
а	-	3
b	а	2
С	-	5
d	b, c	2
е	а	4
f	b, c	6
g	e, d	5

a. Dibuje una red para este proyecto.


b.Haga un pase hacia adelante y un pase hacia atrás para determinar el IP, TP, IL y TL.

c.¿Cuál es la ruta crítica y el tiempo de terminación del proyecto?

Solución 1:

Parte a y b:

En el siguiente gráfico se presenta la red del proyecto y los valores del IP, TP, IL y TL de cada actividad:

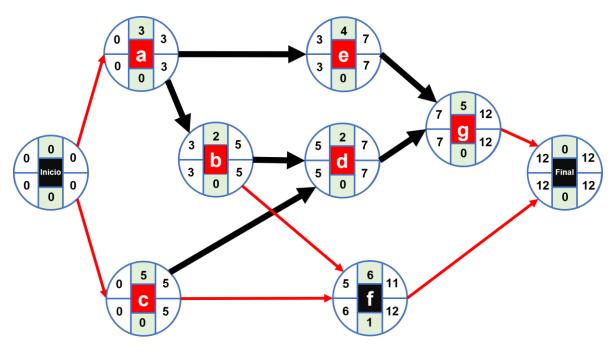

Parte c:

En este ejemplo tenemos 3 rutas críticas:

- a e g
- a-b-d-g
- c d -g

Con una duración total de 12 días.

Ejercicio 2:

El arranque de una planta se basa en la siguiente red:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
а	-	4
b	-	8
С	-	3
d	а	3
е	а	6
f	С	5
g	b, d	6

a. Dibuje una red para este proyecto.


b.¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto?

c. Identifique la ruta crítica.

Solución 2:

Parte a:

En el siguiente gráfico se presenta la red del proyecto:

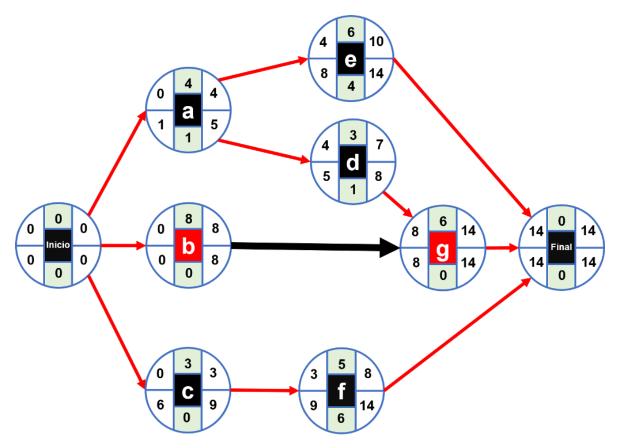

Parte b:

La duración del proyecto es de 14 días.


Parte c:

La ruta crítica es **b** – **g**.

Ejercicio 3:

Al prepararse para la enseñanza de un nuevo curso, un profesor estima los siguientes tiempos de las actividades:

Artículos Relacionados Dashboard para seguimiento de Proyectos en excel + Descarga gratis

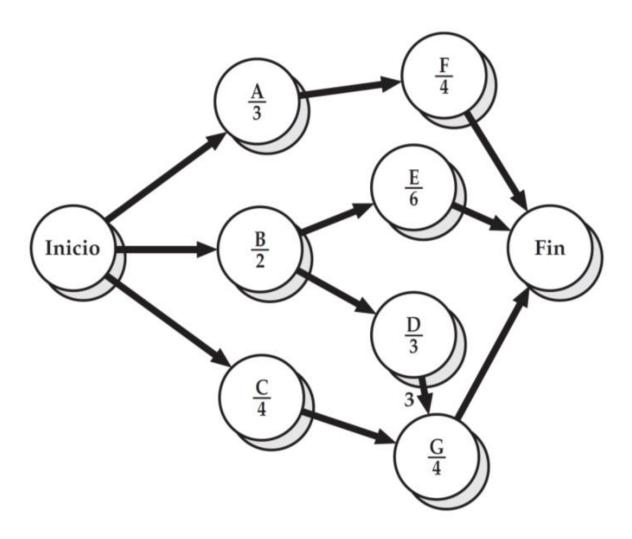


a.Encuentre la fecha de terminación del proyecto. b.¿Cuál es la ruta crítica?

Solución 3:

Parte a:

En el siguiente gráfico se presenta la red completa del proyecto:

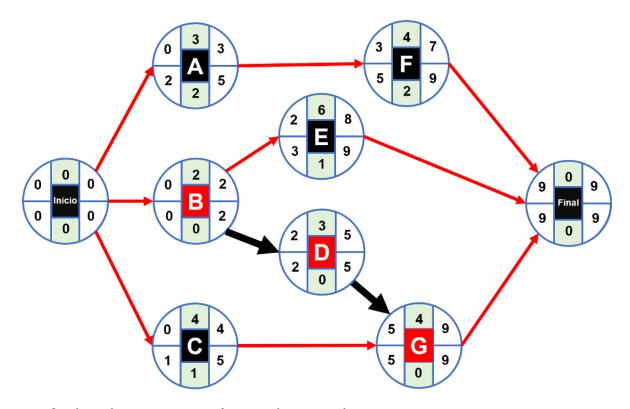

La fecha de terminación es dentro de 9 días.

Parte b:

La ruta crítica es **b** – **d** – **g**.

Ejercicio 4:

Las siguientes actividades son parte de un proyecto para programarse con CPM:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
Α	-	3
В	Α	3
С	Α	7
D	C	2
E	B, D	4
F	D	3
G	E, F	7

a.Trace la red.

b.¿Cuál es la ruta crítica?


c.¿Cuántas semanas tardará todo el proyecto?

d.¿Cuánto tiempo de demora previsible tendrá la actividad B?

Solución 4:

Parte a:

En el siguiente gráfico se presenta la red completa del proyecto:

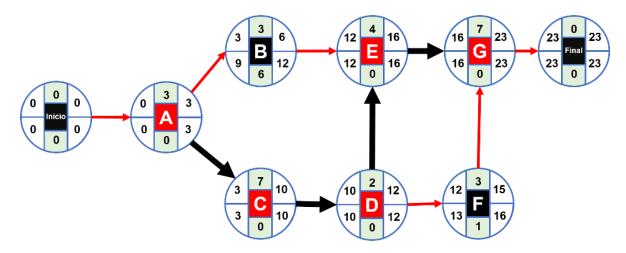

Parte b:

La ruta crítica es A - C - D - E - G.

Parte c:

El proyecto tiene una duración de 23 semanas.

Parte d:

La demora previsible (holgura) de la actividad B es 6 semanas.

Ejercicio 5:

El departamento de investigación y desarrollo planea competir por un gran proyecto para un nuevo sistema de comunicación en aviones comerciales. La tabla siguiente muestra las actividades, tiempos y secuencias requeridas:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
Α	-	3
В	Α	2
С	Α	4
D	Α	4
E	В	6
F	C, D	6
G	D, F	2
Н	D	3
1	E, G, H	3

a.Trace la red.

b.¿Cuál es la ruta crítica?


c. Suponga que desea acortar el tiempo de terminación tanto como sea posible, y tiene la opción de acortar cualquiera o todas las B, C, D y G una por semana. ¿Cuál acortaría usted?

d.¿Cuál es la nueva ruta crítica y el tiempo de terminación más temprano?

Solución 5:

Parte a:

En el siguiente gráfico se presenta la red completa del proyecto:

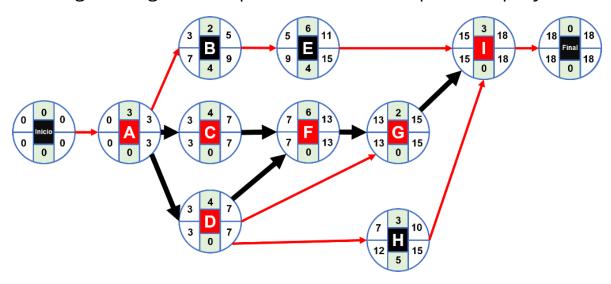


Parte b:

Las rutas críticas son A – C – F – G – I además de A – D – F – G – I. *Parte c:*

Como tenemos dos rutas críticas, iniciaremos acortando la actividad G que se encuentra en ambas rutas. Lo siguiente es acortar las actividades C y D a la vez para disminuir el tiempo en ambas rutas críticas. Finalmente la actividad B no es necesario acortarla debido a que no es una actividad crítica.

Parte d:

En el siguiente gráfico se presenta la nueva red donde se aprecian las rutas críticas **A** – **C** – **F** – **G** – **I** además de **A** – **D** – **F** – **G** – **I**:

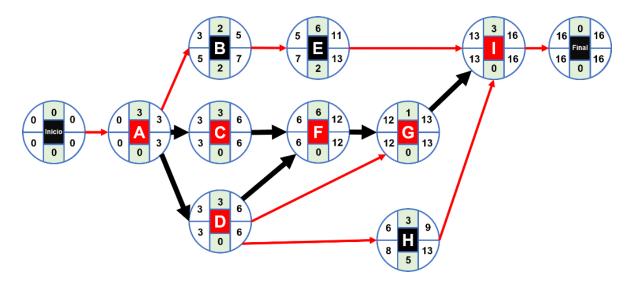

El tiempo de terminación más próximo del proyecto es de 16 semanas.

Artículos Relacionados Ejercicios resueltos de plan agregado de producción con solver (archivos para descargar)

Ejercicio 6:

Las actividades descritas en la tabla siguiente corresponden a Duplaga Corporation:

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
Α	-	9
В	Α	7
С	Α	3
D	В	6
E	В	9
F	С	4
G	E, F	6
н	D	5
1	G, H	3

a. Dibuje el diagrama PERT de AEN apropiado para el equipo de administración de Ed Duplaga.


b.Determine la ruta crítica.

c.¿Cuál es el tiempo de terminación del proyecto?

Solución 6:

Parte a:

En el siguiente gráfico se presenta la red completa del proyecto:

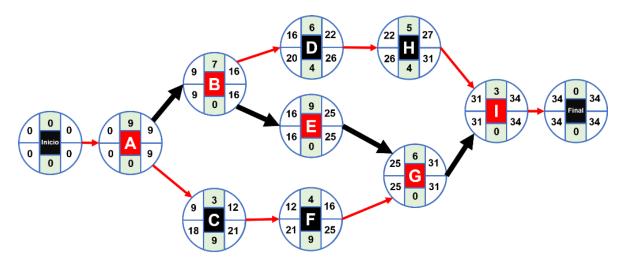

Parte b:

La ruta crítica es A - B - E - G - I.

Parte c:

El proyecto tiene una duración de 34 semanas.

Ejercicio 7:

Las actividades necesarias para la construcción de una máquina experimental para la detección de contaminantes químicos en Charlie Cook Corp., se enlistan en la tabla siguiente:


Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (semanas)
Α	-	6
В	-	7
С	Α	3
D	Α	2
E	В	4
F	В	6
G	C, E	10
Н	D, F	7

a. Construya una red AEN para esas actividades. b.A Cook le gustaría determinar los tiempos de IC, TC, IL, TL y holgura para cada actividad. También deben determinarse el tiempo de terminación de todo el proyecto y la ruta crítica.

Solución 7:

Parte a y b:

A continuación se represente la red del proyecto con la IC, TC, IL, TL y holgura para cada actividad:

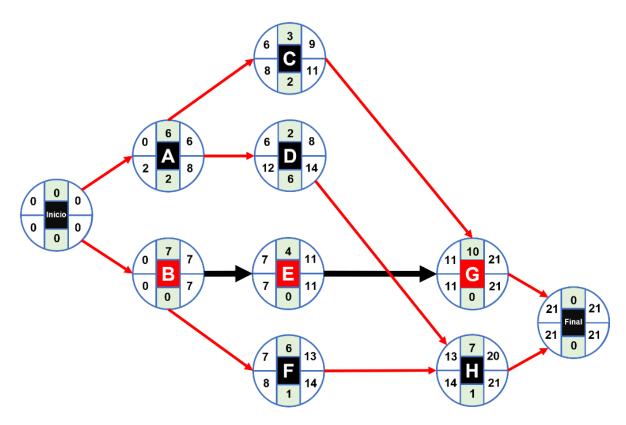

La ruta crítica es **B – E – G**, y la duración total del proyecto es de **21 semanas**.

Ejercicio 8:


Se tiene el siguiente proyecto con 25 actividades:

0 etividad	Duncadantas	Duración (semanas)			
Actividad	Precedentes	Tiempo Pesimista	Tiempo Medio	Tiempo Optimista	
Α		6	4	3	
В		3	2	1	
С	Α	5	3	2	
D	Α	10	6	4	
E	Α	4	2	1	
F	В	7	5	3	
G	В	6	4	2	
Н	С	5	3	1	
1	Н	8	5	3	
J	D	9	5	3	
K	E	4	2	1	
L	G	12	6	3	
M	L	5	3	1	
N	I,J,K	6	3	1	
0		9	5	2	
P	0	8	5	1	
Q	0	7	4	1	
R	0	5	3	1	
S	E,P	3	2	1	
Т	R,S	4	2	1	
U	T	5	3	1	
V	T	6	3	1	
W	T	7	4	1	
X	В	8	4	2	
Υ	W	4	2	1	


Calcular la ruta crítica y el tiempo de finalización del proyecto.

Solución:

Para resolver este ejercicio utilizaremos nuestra <u>calculadora de la</u> <u>ruta crítica</u>:

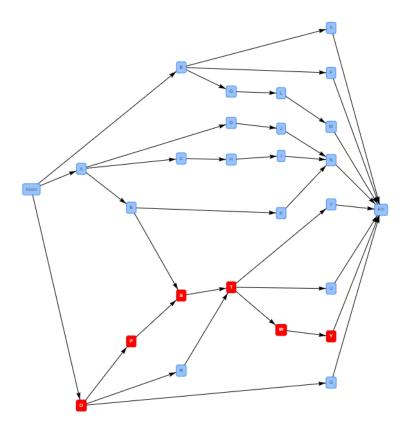

Al hacer clic en los nodos puedes ver el detalle de los tiempos:

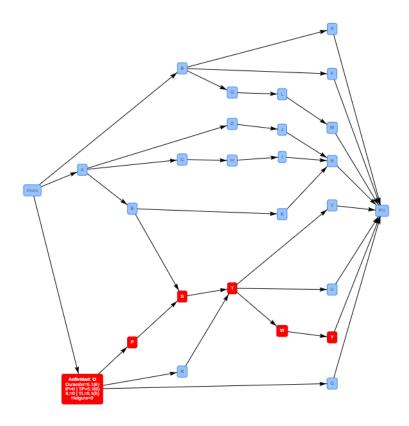

Finalmente puedes encontrar los resultados detallados en las siguientes tablas (los números entre paréntesis indican decimales periódicos. Ejemplo: 0.(3) = 0.3333...)

Actividad	Tiempo Optimista (T _o)	Tiempo Medio (T _m)	Tiempo Pesimista (T _p)	Tiempo Esperado (T _e)	Desviación Estándar (σ)	Varianza (σ ²)
Α	3	4	6	4.1(6)	0.5	0.25
В	1	2	3	2	0.(3)	0.(1)
С	2	3	5	3.1(6)	0.5	0.25
D	4	6	10	6.(3)	1	1
E	1	2	4	2.1(6)	0.5	0.25
F	3	5	7	5	0.(6)	0.(4)
G	2	4	6	4	0.(6)	0.(4)
н	1	3	5	3	0.(6)	0.(4)
1	3	5	8	5.1(6)	0.8(3)	0.69(4)
J	3	5	9	5.(3)	1	1
К	1	2	4	2.1(6)	0.5	0.25
L	3	6	12	6.5	1.5	2.25
М	1	3	5	3	0.(6)	0.(4)
N	1	3	6	3.1(6)	0.8(3)	0.69(4)
0	2	5	9	5.1(6)	1.1(6)	1.36(1)
Р	1	5	8	4.8(3)	1.1(6)	1.36(1)
Q	1	4	7	4	1	1
R	1	3	5	3	0.(6)	0.(4)
s	1	2	3	2	0.(3)	0.(1)
Т	1	2	4	2.1(6)	0.5	0.25
U	1	3	5	3	0.(6)	0.(4)
v	1	3	6	3.1(6)	0.8(3)	0.69(4)
w	1	4	7	4	1	1
x	2	4	8	4.(3)	1	1
Υ	1	2	4	2.1(6)	0.5	0.25

Actividad	Duración	Inicio más próximo (IP)	Término más próximo (TP)	Inicio más lejano (IL)	Termino más lejano (TL)	Holgura
Α	4.1(6)	0	4.1(6)	1.(3)	5.5	1.(3)
В	2	0	2	4.8(3)	6.8(3)	4.8(3)
С	3.1(6)	4.1(6)	7.(3)	5.8(3)	9	1.(6)
D	6.(3)	4.1(6)	10.5	5.5	11.8(3)	1.(3)
E	2.1(6)	4.1(6)	6.(3)	7.8(3)	10	3.(6)
F	5	2	7	15.(3)	20.(3)	13.(3)
G	4	2	6	6.8(3)	10.8(3)	4.8(3)
н	3	7.(3)	10.(3)	9	12	1.(6)
ı	5.1(6)	10.(3)	15.5	12	17.1(6)	1.(6)
J	5.(3)	10.5	15.8(3)	11.8(3)	17.1(6)	1.(3)
K	2.1(6)	6.(3)	8.5	15	17.1(6)	8.(6)
L	6.5	6	12.5	10.8(3)	17.(3)	4.8(3)
М	3	12.5	15.5	17.(3)	20.(3)	4.8(3)
N	3.1(6)	15.8(3)	19	17.1(6)	20.(3)	1.(3)
0	5.1(6)	0	5.1(6)	0	5.1(6)	0
Р	4.8(3)	5.1(6)	10	5.1(6)	10	0
Q	4	5.1(6)	9.1(6)	16.(3)	20.(3)	11.1(6)
R	3	5.1(6)	8.1(6)	9	12	3.8(3)
s	2	10	12	10	12	0
т	2.1(6)	12	14.1(6)	12	14.1(6)	0
U	3	14.1(6)	17.1(6)	17.(3)	20.(3)	3.1(6)
v	3.1(6)	14.1(6)	17.(3)	17.1(6)	20.(3)	3
w	4	14.1(6)	18.1(6)	14.1(6)	18.1(6)	0
x	4.(3)	2	6.(3)	16	20.(3)	14
Υ	2.1(6)	18.1(6)	20.(3)	18.1(6)	20.(3)	0

La ruta crítica es: $\mathbf{O} \to \mathbf{P} \to \mathbf{S} \to \mathbf{T} \to \mathbf{W} \to \mathbf{Y}$

La varianza del proyecto es: 4.(3)

El tiempo total del proyecto es: 20.(3) semanas

Reflexión Final

Como puedes ver, calcular la ruta crítica no es un proceso complicado; estamos seguros de que nuestra entrada "Ruta crítica: ejercicios resueltos con el método PERT CPM" te ayudarán muchísimo a mejorar tu aprendizaje.
